

福島県

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025a/saigaifukkyu.html

災害復旧工事進捗状況

ツイート 2

いいね! 2

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年9月11日更新


災害復旧工事進捗状況

東日本大震災、新潟・福島豪雨災害、台風15号災害の復旧工事進捗状況についてお知らせします。

◆県の公共土木施設の災害復旧工事は、平成26年9月1日取りまとめ現在、発生災害別下表のと通りの進捗となっております。

- 東日本大震災で被災した箇所については、83%の箇所で事業に着手し、62%の箇所で完成に至っています。
- 新潟・福島豪雨で被災した箇所については、100%の箇所で事業に着手し、95%の箇所で完成に至っています。
- 台風15号で被災した箇所については、98%の箇所で事業に着手し、97%の箇所で完成に至っています。
- 全体では、86%の箇所で事業に着手し、68%の箇所で完成に至っています。

◆今後も復旧工事の早期完了を目指し、県民の皆さんの安全安心の確保に努めてまいります。

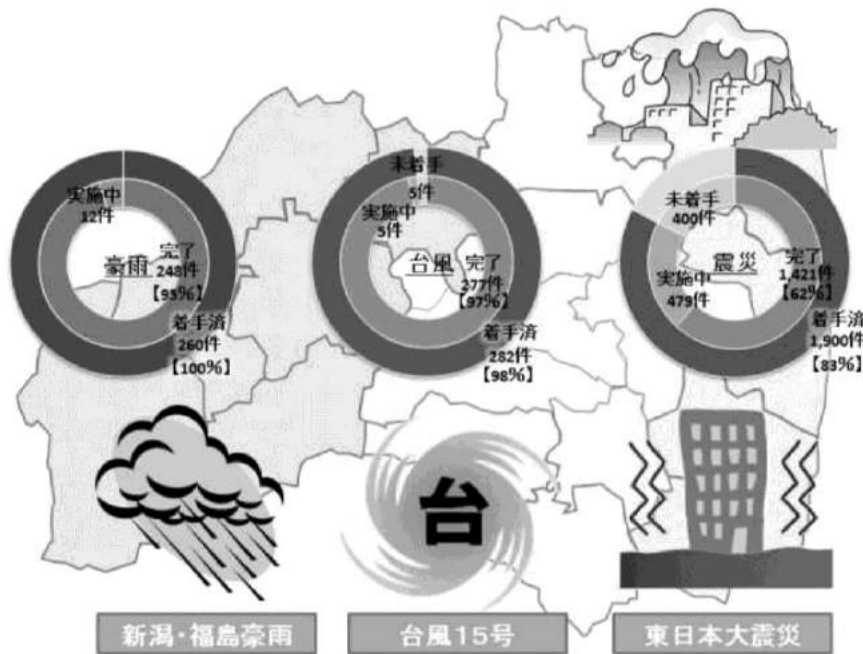

東日本大震災

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別	2,300	1,900	1,421	83%	62%
河川	258	228	160	88%	62%
砂防	21	21	21	100%	100%

海岸	159	108	26	68% ■■■■■■■■□□□□	16% ■□□□□□□□□□
道路	865	734	672	85% ■■■■■■■■■□	78% ■■■■■■■■■□□
橋梁	53	37	27	65% ■■■■■■■■□□	51% ■■■■■■□□□□
港湾	332	294	245	89% ■■■■■■■■■□	74% ■■■■■■■□□□
漁港	515	381	173	74% ■■■■■■■□□□	34% ■■□□□□□□□□
下水	3	3	3	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
公園	5	5	5	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
公営住宅	89	89	89	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
方部別	2,300	1,900	1,421	88% ■■■■■■■■■□	65% ■■■■■■□□□□
会津	26	26	26	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
中通り	542	528	528	97% ■■■■■■■■■	97% ■■■■■■■■■
浜通り	1,732	1,346	867	78% ■■■■■■■■□□	50% ■■■■□□□□□□

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(会津)	26	26	26	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
河川	5	5	5	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
道路	16	16	16	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
港湾	1	1	1	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■
公営住宅	4	4	4	100% ■■■■■■■■■■	100% ■■■■■■■■■■

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)

工種別(中通り)	542	528	528	97%	97%
河川	72	71	71	99%	99%
砂防	13	13	13	100%	100%
道路	400	387	387	97%	97%
橋梁	13	13	13	100%	100%
下水	3	3	3	100%	100%
公営住宅	41	41	41	100%	100%

東日本大震災	査定決定数	着工件数	完了件数	着工率(%)	完了率(%)
工種別(浜通り)	1,732	1,346	867	78%	50%
河川	181	152	84	84%	46%
砂防	8	8	8	100%	100%
海岸	159	108	26	68%	16%
道路	449	331	269	74%	60%
橋梁	40	24	14	60%	35%
港湾	331	293	244	89%	74%
漁港	515	381	173	74%	34%
公園	5	5	5	100%	100%
公営住宅	44	44	44	100%	100%

